


УТВЕРЖДАЮ

Председатель

Контрольно-счетной палаты

г. Улан-Удэ

 Л. Ю. Убеева

«7» октября 2022 года

ОТЧЕТ № 10

о результатах выборочной проверки целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных в 2021 году на строительство физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа в МАОУ «СОШ №13», МАОУ «СОШ №43», МАОУ «СОШ №55»

1. Основание для проведения контрольного мероприятия: Положение о Контрольно-счетной палате г. Улан-Удэ, План работы Контрольно-счетной палаты на 2022 год, приказ на проведение контрольного мероприятия от 29.08.2022 №33.

2. Цели контрольного мероприятия: определить эффективность и целевое использование бюджетных средств, направленных в 2021 году на строительство физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа в МАОУ «СОШ №13», МАОУ «СОШ №43», МАОУ «СОШ №55».

3. Предмет контрольного мероприятия: нормативные правовые акты и иные распорядительные документы, регламентирующие строительство физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа в МАОУ «СОШ №13», МАОУ «СОШ №43», МАОУ «СОШ №55», источники финансирования строительства указанных объектов, документы, подтверждающие объемы осуществленного финансирования, договоры, контракты.

4. Проверяемый период деятельности: 2021 год.

5. Сроки проведения контрольного мероприятия на объекте проверки: с 31.08.2022 по 28.09.2022.

6. Объекты контрольного мероприятия: МУ «Улан-Удэстройзаказчик», МАОУ «СОШ №13» (далее – СОШ №13), МАОУ «СОШ №43» (далее – СОШ №43), МАОУ «СОШ №55» (далее – СОШ №55).

По результатам контрольного мероприятия оформлены акты выборочной проверки целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных в 2021 году на строительство физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа в МАОУ «СОШ №13», МАОУ «СОШ №43», МАОУ «СОШ №55» от 27.09.2022 №51 (СОШ №13), от 27.09.2022 №52 (СОШ №43), от 27.09.2022 №53 (СОШ №55), от 28.09.2022 №54 (МУ «Улан-Удэстройзаказчик»). Руководители проверенных учреждений ознакомлены с актами под роспись. Акты подписаны без возражений.

Объем проверенных средств – 102 863,7 тыс. рублей.

7. Перечень изученных документов представлен в приложении к отчету.

8. Результаты контрольного мероприятия

8.1. Общие положения

8.1.1. В соответствии с Указом Президента РФ от 07.05.2018 №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» в сфере демографического развития необходимо обеспечить к

2024 году решение задачи по созданию для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта.

Задачей федерального проекта «Спорт - норма жизни» в рамках национального проекта «Демография» является увеличение к 2030 году количества систематически занимающихся физической культурой и спортом жителей России до 70%.

Строительство физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа в 2021 году в МАОУ «СОШ №13», МАОУ «СОШ №43», МАОУ «СОШ №55» осуществлялось в рамках реализации федерального проекта «Спорт - норма жизни», государственной программы Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта», государственной программы Республики Бурятия «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики», муниципальной программы «Развитие образования г. Улан-Удэ».



Функции заказчика-застройщика по объектам городского заказа по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов в городе Улан-Удэ осуществляет муниципальное учреждение «Улан-Удэстройзаказчик» (далее - Учреждение, МУ «Улан-Удэстройзаказчик»), которое создано на основании распоряжения Администрации г. Улан-Удэ от 15.04.2015 №531-р. Учреждение является некоммерческой организацией, финансируемой за счет средств городского бюджета, в пределах ежегодно утверждаемой сметы расходов. Учредителем является «Комитет по строительству Администрации г. Улан-Удэ». Учреждение является юридическим лицом, имеет обособленное имущество на праве оперативного управления, самостоятельный баланс, счета в финансовых органах в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, печать, штамп и бланки со своим наименованием. Учреждение осуществляет свою деятельность для обеспечения организации строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов муниципального заказа и контроля за ходом его выполнения.

8.1.2. В состав сооружений объекта: «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа в МАОУ «СОШ №13» (далее – ФОК СОШ №13) входит: футбольное поле размером 60*30 м, беговые дорожки вокруг футбольного поля (площадь резинового покрытия – 1493,3 кв.), хоккейная коробка 20*40м, универсальная спортивная площадка 30*16м (баскетбол, волейбол), площадка для уличных тренажеров 12*15 м, уличный спортивный комплекс 12*15м, сектор для прыжков в длину, две трибуны.



Строительство ФОК осуществлено в границах территории СОШ №13 на земельном участке с кадастровым номером: 03:24:022108:319 площадью 15 727 м², расположенному по адресу г.Улан-Удэ, Радищева, 5б. Общая площадь застройки – 7579,3 кв.м.

Проектная документация на строительство ФОК разработана в 2020 году ООО «СистемИнжиниринг». АУ РБ «Госэкспертиза» выдано положительное заключение государственной экспертизы проектной документации от 01.03.2021 №03-1-1-3-008613-2021. Распоряжением Республиканской службы государственного строительного и жилищного надзора от 30.12.2021 года №56-РЗ утверждено заключение о соответствии построенного объекта капитального строительства требованиям проектной документации (№56-1-7/2021 от 30.12.2021 года).

Палата отмечает, что спортивный объект не передан в эксплуатирующую организацию, на момент проведения контрольного мероприятия комплекс числится на балансе МУ «Улан-Удэстройзаказчик» в связи с наличием замечаний к качеству выполненных работ при строительстве ФОК. В настоящее время проводится работа по устранению замечаний.

8.1.3. В состав сооружений объекта: «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа в МАОУ «СОШ №43 г.Улан-Удэ» (далее – ФОК СОШ №43) входит: футбольное поле размером 60*30м, беговые дорожки вокруг футбольного поля (площадь резинового покрытия – 1269,7 кв.м.), хоккейная коробка 20*40м, площадка для уличных тренажеров площадью 150 кв.м, уличный спортивный комплекс площадью 150 кв.м, сектор для прыжков в длину, трибуна.



Строительство ФОК осуществлено в границах территории СОШ №43 на земельном участке с кадастровым номером: 03:24:010614:214 площадью 13273м², расположенному по адресу г.Улан-Удэ, ул. Составная, 2. Общая площадь застройки – 4677,5 кв.м.

Проектная документация на строительство ФОК разработана в 2019 году ИП Чебунин В.В. АУ РБ «Госэкспертиза» выдано положительное заключение государственной экспертизы проектной документации от 07.04.2021 №03-1-1-3-01684-2021. Распоряжением Республиканской службы государственного строительного и жилищного надзора от 30.12.2021 года №59-РЗ утверждено заключение о соответствии построенного объекта капитального строительства требованиям проектной документации (№59-1-2/2021 от 30.12.2021 года).

Палата отмечает, что спортивный объект не передан в эксплуатирующую организацию, на момент проведения контрольного мероприятия комплекс числится на балансе МУ «Улан-Удэстройзаказчик» в связи с наличием замечаний к качеству выполненных работ при строительстве ФОК. В настоящее время проводится работа по устранению замечаний.

8.1.4. В состав сооружений объекта «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа в МАОУ «СОШ №55 г.Улан-Удэ» (далее – ФОК СОШ №55) входит: футбольное поле размером 60*30м, беговые дорожки вокруг футбольного поля (площадь резинового покрытия – 1358,2 кв.), хоккейная коробка 20*40м,



площадка для уличных тренажеров площадью 180 кв.м, уличный спортивный комплекс площадью 178 кв.м, сектор для прыжков в длину, трибуна.

Строительство ФОК осуществлено в границах территории СОШ №55 на земельном участке с кадастровым номером: 03:24:034620:334 площадью 13011 м², расположенному по адресу г.Улан-Удэ, ул. В. Шукшина, 1. Общая площадь застройки – 5819 кв.м.

Проектная документация на строительство ФОК разработана в 2020 году ООО «СистемИнжиниринг». АУ РБ «Госэкспертиза» выдано положительное заключение государственной экспертизы проектной документации от 21.04.2021 №03-1-1-3-019625-2021. Распоряжением Республиканской службы государственного строительного и жилищного надзора от 30.12.2021 года №57-РЗ утверждено заключение о соответствии построенного объекта капитального строительства требованиям проектной документации (№57-1-7/2021 от 30.12.2021 года).

Объект строительства распоряжением Комитета по управлению имуществом и землепользованию Администрации г.Улан-Удэ от 20.06.2022 №292 принят от МУ «Улан-Удэстройзаказчик» на учет муниципальной казны и закреплен на праве оперативного управления за СОШ №55.

8.2. Анализ нормативных документов по финансированию объектов строительства ФОК СОШ №13, СОШ №43, СОШ №55

8.2.1. Расходные обязательства г.Улан-Удэ по строительству спортивных объектов приняты на основании соглашения о предоставлении субсидии бюджету муниципального образования «городской округ «город Улан-Удэ» с Министерством строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса РБ от 28.01.2021 №81701000-1-2020-014 (далее – соглашение о предоставлении субсидии от 28.01.2021, соглашение). Предметом соглашения является предоставление бюджету «городского округа «город Улан-Удэ» субсидии на финансовое обеспечение мероприятий федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы» в рамках государственной программы Республики Бурятия «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики», утвержденной постановлением Правительства РБ от 29.12.2012 №823. Уровень софинансирования из федерального бюджета и бюджета субъекта Российской Федерации составил 99%. Конечным результатом исполнения соглашения является введение в эксплуатацию спортивных объектов в срок до 25.12.2021 года. В соответствии с соглашением общий объем бюджетных ассигнований на строительство физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа составил: в СОШ №13 - 34 550,4 тыс. рублей, в СОШ №43 – 37 094,1 тыс. рублей, в СОШ №55 – 31 219,2 тыс. рублей.

Соглашением установлена плановая дата достижения результатов предоставления субсидии (строительство и введение в эксплуатацию спортивных объектов) – 25.12.2021. Контрольно-счетная палата отмечает, что разрешения на ввод объектов строительства в эксплуатацию выданы 30.12.2021, что позже плановой даты достижения результатов предоставления субсидии на 5 дней. При этом приемка заказчиком законченных строительством объектов капитального строительства от подрядчика согласно подписанных актов проведена в установленные соглашением

сроки (СОШ №13 – 20.12.2021, СОШ №13 – 20.12.2021, СОШ №55 – 23.12.2021).

8.2.2. Решение об осуществлении бюджетных инвестиций на осуществление капитальных вложений в строительство ФОК в СОШ №№13, 43, 55 принято распоряжениями Администрации г.Улан-Удэ – от 19.05.2021 № 418-р, от 25.06.2021 № 577-р «О принятии решения о предоставлении бюджетных инвестиций на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности».

Выделение бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности было предусмотрено решением Улан-Удэнского городского Совета депутатов о бюджете на 2021 год. В структуре расходов главному распорядителю бюджетных средств МУ «Комитет по строительству Администрации г. Улан-Удэ» на строительство указанных спортивных объектов предусмотрены ассигнования в сумме 102 863,6 тыс. рублей, в т.ч. по СОШ №13 - 34 550,4 тыс. рублей, СОШ №43 - 37 094,1 тыс. рублей, СОШ №55 - 31 219,2 тыс. рублей.

8.3. Анализ проведения процедур закупок для муниципальных нужд, проверка целевого и эффективного использования средств, направленных в 2021 году на строительство ФОК в СОШ №13, СОШ №43, СОШ №55.

8.3.1. НМЦК на строительство ФОК СОШ №13 определена в соответствии с частью 12 статьи 22 Федерального закона №44-ФЗ «иным методом» в связи с превышением полученных в результате расчета смет над лимитами бюджетных обязательств (сметный расчет - 39 631,3 тыс. рублей, ЛБО -35 773,8 тыс. рублей). АУ РБ «Госэкспертиза» проведена проверка достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства, выдано положительное заключение экспертизы от 15.04.2021 №03-1-1-2-018442-2021.

На участие в открытом конкурсе в электронной форме на проведение работ по строительству подано четыре заявки, все заявки признаны соответствующими требованиям Федерального закона №44-ФЗ. На основании рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме победителем признано ООО «Балси». Анализ процесса осуществления закупки не выявил факторов, ограничивающих число участников закупок.



Муниципальный контракт заключен 07.06.2021 №2021.0395 с ООО «Балси» на сумму 31 409,4 тыс. рублей (НМЦК 35 773,8 тыс. рублей, экономия – 4 364,4 тыс. рублей), срок выполнения работ с даты подписания контракта, окончание выполнения работ - 31.10.2021г. (далее - контракт от 07.06.2021).

В процессе исполнения контракта заключены 4 дополнительных соглашения. При этом, дополнительным соглашением от 17.12.2021 №4 цена контракта увеличена до 34 550,4 тыс. рублей. Приложением к дополнительному соглашению утверждена новая смета контракта на указанную сумму. Анализ сметного расчета показал, что корректировка сметного расчета произведена путем включения в смету контракта 8 дополнительных пунктов:

«п. 25.1. ЛСР №02-01-01 И1 яма для прыжков (пп.13; 13.1; 13.2), тренажеры (пп.26-28.6; 28.9; 28.11-28.15), исключение (1 комплекс)» со стоимостным показателем «минус 435,5 тыс. рублей»;

«п. 25.2. ЛСР №02-01-01 Д1 футбольное поле (пп.4.5-4.9; 6.1; 6.4), беговые дорожки (пп.9.9; 9.10; 9.12; 9.13), хоккейная коробка (пп.16.9; 16.10; 16.12; 16.13), спортивная площадка (пп.21.9; 21.10; 21.12; 21.13), площадка для тренажеров, уличный спортивный комплекс (пп.24.9; 24.10), дополнение (1 комплекс)» со стоимостным показателем «плюс 4 828,5 тыс. рублей»;

«п. 45.1. ЛСР № 02-01-02 И1 устройство ограждения (пп.14.1; 16.1; 16.2; 17), исключение (1 комплекс)» со стоимостным показателем «минус 220,9 тыс. рублей»;

«п. 45.2. ЛСР № 02-01-02 Д1 подпорная стенка (пп.5.1; 5.2), гидроизоляция подпорных стен (пп.7.2; 7.2.1; 7.2.2), устройство ограждения (пп.14; 14.2; 14.2.1; 15; 15.1; 16; 17.1; 17.2), дополнение (1 комплекс)» со стоимостным значением «плюс 1 104,5 тыс. рублей»;

«п. 46.1. ЛСР № 02-01-03 И1 наружное освещение (пп.1; 3.4; 3.5), исключение (1 комплекс)» со стоимостным показателем «минус 723,0 тыс. рублей»;

«п. 46.2. ЛСР № 02-01-03 Д1 наружное освещение (пп.1.1; 3.6-3.6.3), дополнение (1 комплекс)» со стоимостным показателем «плюс 170,0 тыс. рублей»;

«п. 48.1. ЛСР № 02-01-04 И1 узел коммутации №1 (пп.1-4.1; 5.3; 7-8.2), узел коммутации №2 (пп.9-16.2), узел коммутации №3 (пп.17-24.2), шкаф телекоммутиационный (пп.25.1; 26; 26.1), видеонаблюдение (пп.27-28.1; 29-30.1), сети связи (пп.31-40), исключение (1 комплекс)» со стоимостным показателем «минус 1 600,6 тыс. рублей»;

«п. 48.2. ЛСР № 02-01-04 Д1 узел коммутации №1 (пп.5-5.2; 5.4-5.6), видеонаблюдение (пп.28.2-28.5), дополнение (1 комплекс)» со стоимостным показателем «плюс 48,5 тыс. рублей».

Фактически новые пункты сметного расчета, имеющие стоимостной показатель со знаком «минус», отменяют выполнение работ, предусмотренных сметой контракта до заключения дополнительного соглашения от 17.12.2021 №4, а новые пункты сметного расчета, имеющие стоимостной показатель со знаком «плюс» предусматривают выполнение работ по строительству физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа в МАОУ «СОШ № 13» г. Улан-Удэ без их разбивки по наименованиям комплексов (видов) работ и их цены на единицу измерения (Палата отмечает, что наименование комплексов (видов) работ указаны в графике исполнения контракта).

Таким образом, при заключении дополнительного соглашения от 17.12.2021 №4 МУ «Улан-Удэстройзаказчик» не обеспечено соблюдение требований ст.110.2 Федерального закона №44-ФЗ («Особенности заключения и исполнения контракта, предметом которого является подготовка проектной документации и (или) выполнение инженерных изысканий, и контрактов, предметом которых являются строительство, реконструкция объектов капитального строительства»), а также Методики составления сметы контракта, предметом которого являются



строительство, реконструкция объектов капитального строительства, утвержденной приказом Минстроя России от 23.12.2019 №841/пр. Общая сумма работ, включенная в смету контракта, являющейся приложением к дополнительному соглашению от 17.12.2021г. №4, с нарушением Федерального закона №44-ФЗ составляет сумму 6 151,5 тыс. рублей.

Заказчиком произведена оплата по контракту на основании актов выполненных работ на общую сумму 34 550,4 тыс. рублей.

Палата отмечает, что пунктом 2.2 муниципального контракта с учетом дополнительного соглашения от 29.10.2021 №2 предусмотрен срок выполнения работ до 01.12.2021. Акт выполненных работ по ф.КС-3, КС-2 (№7) подписан 20.12.2021, акт законченного строительства (ф. КС-11) подписан 20.12.2021. Таким образом, срок выполнения работ нарушен на 19 календарных дней. В соответствии с ч.1 ст.94 Федерального закона №44-ФЗ исполнение контракта включает в себя комплекс мер, реализуемых после заключения контракта и направленных на достижение целей осуществления закупки путем взаимодействия заказчика с подрядчиком в соответствии гражданским законодательством и настоящим Федеральным законом, в т.ч. применение мер ответственности и совершение иных действий в случае нарушения подрядчиком условий контракта. МУ «Улан-Удэстройзаказчик» в нарушение ч.6 ст.34 Федерального закона №44-ФЗ, условий контракта от 07.06.2021 на момент проведения контрольного мероприятия меры ответственности к ООО «Балси» ввиду ненадлежащего исполнения контракта не приняты - требование об оплате пени не направлялось. Расчетно сумма пени на 20.12.2021 составила 40,9 тыс. рублей.

При анализе информации размещенной в единой информационной системе (ЕИС) в сфере закупок (<http://zakupki.gov.ru>) установлено, что сведения об исполнении контракта от 07.06.2021 размещены в реестре контрактов с нарушением регламентированного срока, установленного частью 3 статьей 103 Федерального закона №44-ФЗ (не позднее 5 рабочих дней). Информация об исполнении контракта размещена в ЕИС 14.01.2022 года, при этом платежное поручение - от 24.12.2021 №3313 (оплата через банк проведена 27.12.21). Нарушение содержит признаки административного правонарушения по части 2 статьи 7.31 КоАП РФ.

8.3.2. НМЦК на строительство ФОК СОШ №43 определена в соответствии с частью 12 статьи 22 Федерального закона №44-ФЗ «иным методом» в связи с превышением полученных в результате расчета смет, над лимитами бюджетных обязательств (сметный расчет – 44 329,6 тыс. рублей, ЛБО -38 716,3 тыс. рублей). АУ РБ «Госэкспертиза» проведена проверка достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства, выдано положительное заключение экспертизы от 05.06.2019 №03-1-0501-19.

На участие в открытом конкурсе в электронной форме на проведение работ по строительству подано пять заявок, все заявки признаны соответствующими требованиям Федерального закона №44-ФЗ. На основании рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме победителем признано ООО «Балси». Анализ процесса осуществления закупки не выявил факторов, ограничивающих число участников закупок.

Муниципальный контракт заключен 07.06.2021 №2021.0390 с ООО «Балси» на сумму 33 721,9 тыс. рублей (НМЦК 38 716,3 тыс. рублей, экономия – 4 994,4 тыс. рублей), срок выполнения работ с момента подписания контракта, окончание выполнения работ - 31.10.2021 (далее – контракт от 07.06.2021).

В процессе исполнения контракта заключены 4 дополнительных соглашения. При этом, дополнительным соглашением от 17.12.2021 №4 цена контракта увеличена до 37 013,6 тыс. рублей. Приложением к дополнительному соглашению утверждена новая смета контракта на указанную сумму.

Анализ сметного расчета показал, что корректировка сметного расчета произведена путем включения в смету контракта 6 дополнительных пунктов:

«п. 55.1. ЛСР №02-01-01 И1 (позиция по ЛСР №11-64) благоустройство, озеленение, ограждение площадки, подпорная стена, исключение (1 комплекс)» со стоимостным показателем «минус 1 267,3 тыс. рублей»;

«п. 55.2. ЛСР №02-01-01 Д1 (позиция по ЛСР №5.1-69.4) вертикальная планировка, ограждение площадки, подпорная стена, дополнение (1 комплекс)» со стоимостным показателем «плюс 5 262,3 тыс. рублей»;

«п. 56.1 ЛСР №02-01-02 И1 (позиция по ЛСР №4.4-24.1) устройство наружного видеонаблюдения, исключение (1 комплекс)» со стоимостным показателем «минус 537,0 тыс. рублей»;

«п. 56.2. ЛСР №02-01-02 Д1 (позиция по ЛСР №4.4-24.1) устройство наружного видеонаблюдения, дополнение (1 комплекс)» со стоимостным значением «плюс 49,9 тыс. рублей»;

«п. 57.1. ЛСР № 02-01-03 И1 (позиция по ЛСР №2-17) устройство наружного освещения, исключение (1 комплекс)» со стоимостным показателем «минус 450,2 тыс. рублей»;

«п. 57.2. ЛСР № 02-01-03 Д1 (позиция по ЛСР №2.2-13.2.1) устройство наружного освещения, дополнение (1 комплекс)» со стоимостным показателем «плюс 221,4 тыс. рублей».

Таким образом, при заключении дополнительного соглашения от 17.12.2021 №4 МУ «Улан-Удэстройзаказчик» не обеспечено соблюдение требований ст.110.2 Федерального закона №44-ФЗ, Методики составления сметы контракта, предметом которого являются строительство, реконструкция объектов капитального строительства. Общая сумма работ, включенная в смету контракта, являющейся приложением к дополнительному соглашению от 17.12.2021г. №4, с нарушением Федерального закона №44-ФЗ составляет сумму 5 533,6 тыс. рублей.

Заказчиком произведена оплата на основании актов выполненных работ на общую сумму 37 013,6 тыс. рублей.

Палата отмечает, что пунктом 2.2 муниципального контракта с учетом дополнительного соглашения от 29.10.2021 №3 предусмотрен срок выполнения работ до 01.12.2021. Акт выполненных работ по ф.КС-3, КС-2 (№7) подписан 20.12.2021, акт законченного строительства (ф. КС-11) подписан 20.12.2021. Таким образом, срок выполнения работ нарушен подрядной организацией на 19 календарных дней. МУ «Улан-Удэстройзаказчик» в нарушение ч.6 ст.34 Федерального закона №44-ФЗ, условий контракта от 07.06.2021 на момент проведения контрольного мероприятия меры ответственности к ООО «Балси» ввиду ненадлежащего исполнения контракта

не приняты - требование об оплате пени не направлялось. Расчетно сумма пени на 20.12.2021 составила 41,2 тыс. рублей.

При анализе информации размещенной в ЕИС установлено, что сведения об исполнении контракта от 07.06.2021 размещены в реестре контрактов с нарушением регламентированного срока, установленного частью 3 статьи 103 Федерального закона №44-ФЗ (не позднее 5 рабочих дней). Информация об исполнении контракта размещена 14.01.2022 года, при этом платежное поручение - от 24.12.2021 №3320 (оплата через банк проведена 27.12.21). Нарушение содержит признаки административного правонарушения по части 2 статьи 7.31 КоАП РФ.

8.3.3. НМЦК на строительство ФОК СОШ №55 определена в соответствии с частью 12 статьи 22 Федерального закона №44-ФЗ «иным методом» в связи с превышением полученных в результате расчета смет, над лимитами бюджетных обязательств (сметный расчет – 32 056,1 тыс. рублей, ЛБО -31 499,5 тыс. рублей). АУ РБ «Госэкспертиза» проведена проверка достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства, выдано положительное заключение экспертизы от 05.06.2019 №03-1-0504-19.

На участие в открытом конкурсе в электронной форме на проведение работ по строительству подано четыре заявки, все заявки признаны соответствующими требованиям Федерального закона №44-ФЗ. На основании рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме победителем признано ООО «Энергостандарт». Анализ процесса осуществления закупки не выявил факторов, ограничивающих число участников закупок.



Муниципальный контракт заключен 10.06.2021 №2021.0426 с ООО «Энергостандарт» на сумму 28 381,1 рублей (НМЦК 31 499,5 тыс. рублей, экономия – 3 118,5 тыс. рублей), срок выполнения работ с момента подписания контракта, окончание выполнения работ - 31.10.2021 (далее – контракт от 10.06.2021).

В процессе исполнения контракта заключены 2 дополнительных соглашения. При этом, дополнительным соглашением от 17.12.2021 №2 цена контракта увеличена до 31 214,0 тыс. рублей.

Анализ сметного расчета показал, что корректировка сметного расчета произведена путем включения в смету контракта 6 дополнительных пунктов:

«п. 22.1. ЛСР №02-01-01 И1 земляные работы (пп.1), яма для прыжков (пп.13-14.1), МАФы (пп.23, 23.1, 23.4-26.10, 26.13-26.15), исключение (1 комплекс)» со стоимостным показателем «минус 537,5 тыс. рублей»;

«п. 22.2. ЛСР №02-01-01 Д1 земляные работы (пп.2.2-2.4), футбольное поле (пп.6.1), беговые дорожки (пп.9.8-9.11), хоккейная коробка (пп.15-15.2), бетонные работы (пп.16-16.2), резиновое покрытие (пп.17.9-17.10), площадка для тренажеров, уличный спортивный комплекс (пп.22.9-22.10), МАФы (пп.26.15-26.17), дополнение (1 комплекс)» со стоимостным показателем «плюс 4 697,8 тыс. рублей»;

«п. 37.1 ЛСР № 02-01-02 И1 лестница (пп.8-13.1), устройство ограждения (пп.14-17.2), мероприятия по обеспечению доступа инвалидов (пп.18-20), исключение (1 комплекс)» со стоимостным показателем «минус 1 824,6 тыс. рублей»;

«п. 37.2. ЛСР № 02-01-02 Д1 подпорная стена (пп.6-6.8.1), дополнение (1 комплекс)» со стоимостным значением «плюс 724,0 тыс. рублей»;

«п.38.1. ЛСР № 02-01-03 И1 наружное освещение (пп.3, 6-11.1), исключение (1 комплекс)» со стоимостным показателем «минус 153,8 тыс. рублей»;

«п. 38.2. ЛСР № 02-01-03 Д1 наружное освещение (пп.3, 17-18, 4-4.1, 8.2, 12, 12.1, 19-21) дополнение (1 комплекс)» со стоимостным показателем «плюс 259,2 тыс. рублей»;

«п.40.1. ЛСР № 02-01-04 И1 узел коммутации №1 (пп.1-2.1, 5-5.3), узел коммутации №2 (пп.9-10.1, 13—13.3), узел коммутации №3 (пп.17.1, 20-20-3), шкаф телекоммутационный (пп.24.1), видеонаблюдение (пп.25.1, 26, 26.1), сети связи (пп.33-33.3), исключение (1 комплекс)» со стоимостным показателем «минус 1 135,4 тыс. рублей»;

«п.40.2. ЛСР № 02-01-04 Д1 узел коммутации №1 (пп.2-2.2, 39, 40-40.2), узел коммутации №2 (пп.10.2, 41-42.2), узел коммутации №3 (пп.7.2, 43-44.2), шкаф телекоммутационный (пп.24.2), видеонаблюдение (пп.25-27.1), сети связи (пп.29-32.1,35, 46-46.1), дополнение (1 комплекс)» со стоимостным показателем «плюс 1 126,3 тыс. рублей»;

«п.50.1. ЛСР № 09-01-01 И1 тепловая сеть (пп.9-9.3), трубопровод (пп.39-41.1), теплоизоляционные и антикоррозийные работы (пп.51-56.1), исключение (1 комплекс)» со стоимостным показателем «минус 666,3 тыс. рублей»;

«п.50.2. ЛСР № 09-01-01 Д1 тепловая сеть (пп.30, 30.1), контрольно-измерительная и запорная арматура (пп.43.2-44.1, 43-46,4, 49-49.1), канал лотковый КЛ 120х60-142м (пп.57-59.2), дополнение (1 комплекс)» со стоимостным показателем «плюс 308,9 тыс. рублей».

Таким образом, при заключении дополнительного соглашения от 17.12.2021 №2 МУ «Улан-Удэстройзаказчик» не обеспечено соблюдение требований ст.110.2 Федерального закона №44-ФЗ, Методики составления сметы контракта, предметом которого являются строительство, реконструкция объектов капитального строительства, утвержденной приказом Минстроя России от 23.12.2019 №841/пр. Общая сумма работ, включенная в смету контракта, являющейся приложением к дополнительному соглашению от 17.12.2021г. №2, с нарушением Федерального закона №44-ФЗ, составляет сумму 7 116,2 тыс. рублей.

Заказчиком произведена оплата на основании актов выполненных работ на общую сумму 31 214,0 тыс. рублей.

Палата отмечает, что пунктом 2.2 муниципального контракта с учетом дополнительного соглашения от 29.10.2021 №1 предусмотрен срок выполнения работ до 01.12.2021. Акт выполненных работ по ф.КС-3, КС-2 (№5) подписан 23.12.2021, акт законченного строительства (ф. КС-11) подписан 23.12.2021. Таким образом, срок выполнения работ нарушен на 22 календарных дня. МУ «Улан-Удэстройзаказчик» в нарушение ч.6 ст.34 Федерального закона №44-ФЗ, условий контракта от 07.06.2021 на момент проведения контрольного мероприятия меры ответственности к ООО «Энергостандарт» ввиду ненадлежащего исполнения контракта не приняты -

требование об оплате пени не направлялось. Расчетно сумма пени на 23.12.2021 составила 105,0 тыс. рублей.

8.3.4. В период контрольного мероприятия проведены выборочные визуальные осмотры и контрольные обмеры с участием представителя МУ «Улан-Удэстройзаказчик» на соответствие объемам, заявленным в двухсторонних актах приемки выполненных работ:

Таблица

№ п / п	Позиции в актах, выполненных работ	Наименование работ	Единица измерения	Объемы работ		Из них	
				В актах вып. работ, ЛСР	Фактически	Отклонения	Стоимость невыполненных работ (расчетно), рублей
СОШ № 13							
Плоскостные сооружения							
ЛСР №02-01-02, №02-01-01 д.1, №02-01-01 и1, акты выполненных работ (КС-2) от 22.10.2022 №5, от 20.12.2021 №7							
Устройство хоккейной коробки							
1	17	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание	100шт	0,68	-	-0,68	-27 542 (3394,68*8,1132)
2	-	Установка металлических столбов высотой до 4 м: на подготовленный бетонный фундамент	100шт	-	0,55	0,55	10 577 (1303,63*8,1132)
3	17.1	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В15 (М200)	м3	4,312	-	-4,312	- 23 260 (2866,95*8,1132)
МАФы							
4	25	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание	100 шт	0,06	-	-0,06	- 810 (99,84*8,1132)
5	25.4	Стойка теннисного корта с сеткой	шт	2	-	-2	-48 107 (5929,42*8,1132)
Итого по плоскостным сооружениям							- 89 142
Подпорная стена ЛСР №02-01-02, ЛСР №02-01-02д1, ЛСР №02-01-02и1, акты выполненных работ (КС-2) от 04.10.2021 №4, от 22.10.2021 №5, от 20.12.2021 №7							
Устройство ограждений							
6	17	Устройство калиток: без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей	100шт	0,05	0,03	0,02	-1 081 (133,27*8,1132)
7	17.1	Петля накладная 30*10	шт	20	12	-8	- 1 168 (144*8,1132)
8	17.2	Ручка – скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт	10	-	-10	-985 (121,44*8,1132)
Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов							
9	19	Укладка металлического накладного профиля (порога)	100 м	0,09	-	-0,09	- 368 (45,3*8,1132)
10	19.1	Профили холодногнутые из алюминиевых сплавов для ограждающих строительных конструкций А6-1000-0.8 (накладка на ступени)	м	9,45	-	-9,45	- 13 065 (1610,37*8,1132)
11	20	Установка указателя на стене	шт	9	-	-9	- 1 310 (161,47*8,1132)
Итого по подпорной стене							-17 977
Всего по ФОК СОШ №13							- 107 119
СОШ № 43							
Благоустройство, озеленение, МАФ и ограждение							
МАФы							
ЛСР №02-01-01, №02-01-01 д.1, №02-01-01 и1, акты выполненных работ (КС-2) от 22.10.2021 №5, от 20.12.2021 №7							

12	36	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание	100шт	0,5	-	-0,5	-36 499 (4604,15*7,9275)
13		Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) тяжелый, крупность заполнителя: 10 мм, класс В15 (М200)	м3	3,17	-	-3,17	
14	-	Установка металлических столбов высотой до 4 м: на подготовленный бетонный фундамент	100шт	-	0,55	0,55	10 334 (1303,63*7,9275)
15	51	Спортивный комплекс	компл	1	-	-1	-156 784 (19 777,22*7,9275)
16	-	Брусья (Уличный тренажер «Брусья»)	шт	-	1	1	17 938 (2 262,8*7,9275)
17	-	Рукоход «Круг», (комплекс турников) применительно	шт	-	1	1	32 213 (4 063,48*7,9275)
18	-	Рукоход «Круг», (комплекс с двумя рукоходами)	шт	-	1	1	32 213 (1*4 063,48*7,9275)
Итого МАФы							- 100 585
Трибуна							
19	-	Установка сборно-разборной трибуны на 100 мест	Комп.	1	0	-1	-453 275
20	-	Сборно-разборной трибуны на 98 мест (применительно)	Комп.	0	1	1	444 210
Итого по трибуне							-9 065
Ограждение площадки. Устройство ограждений.							
21	53	Установка металлических столбов высотой более 4 м: с погружением в бетонное основание	100 шт	0,39	0,37	-0,02	- 868 (0,02*5476,38*7,9275)
22	53.1	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) тяжелый, крупность заполнителя: 10 мм, класс В15 (М200)	м3	7,8	7,4	-0,4	- 2109 (0,4*665*7,9275)
Итого ограждение							-2 977
ВСЕГО по ФОК СОШ №43:							-112 627
СОШ №55							
Плоскостные сооружения ЛСР №02-01-01, акт выполненных работ (КС-2) от 23.12.2021 №5							
Устройство хоккейной коробки							
23	17	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание	100шт	0,68	-	-0,68	-30 767 (3 394,68*9,06326)
24	-	Установка металлических столбов высотой до 4 м: на подготовленный бетонный фундамент	100шт	-	0,59	0,59	12 675 (1398,45*9,06326)
25	17.1	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В15 (М200)	м3	4,312	-	-4,312	- 25 984 (2866,95*9,06326)
Всего по ФОК СОШ №55:							- 44 076
ИТОГО:							-263 822

Таким образом, в нарушение требований ст. 96 Федерального закона №44-ФЗ, ст. 711, 720 Гражданского кодекса РФ, условий муниципальных контрактов МУ «Улан-Удэстройзаказчик» подрядным организациям оплачены фактически невыполненные работы, предъявленные в актах о приемке выполненных работ на сумму 263,8 тыс. рублей, в т.ч. ООО «Балси» - 219,7 тыс. рублей (ФОК СОШ №13, СОШ №43), ООО «Энергостандарт» - 44,1 тыс. рублей (ФОК СОШ №55).



8.3.5. Приняты и оплачены ООО «Балси» по актам КС-2 от 07.09.20221 №3, от 04.10.2021 №4, от 22.10.2021 №5, от 20.12.2021 №7 работы на стадионе СОШ №13 по устройству хоккейной коробки – 3 467,4 тыс. рублей, системы видеонаблюдения на сумму 79,7 тыс. рублей, наружного освещения на сумму 960,7 тыс. руб. Фактический осмотр показал, что система видеонаблюдения на стадионе не функционирует, а из установленных 21 уличных консольных



светильников в исправном состоянии находится только 12. Из пояснений должностных лиц СОШ №13 следует, что причиной отсутствия видеонаблюдения является поломка узла коммутатора, а причина выхода из строя светильников не известна. Кроме того, Контрольно-счетная палата отмечает, что в настоящее время хоккейная коробка находится в непригодном для использования состоянии в связи с разломом резинового покрытия и бетонного основания хоккейной площадки размером 20м*0,03м. Также приняты и оплачены ООО «Балси» по акту КС-2 от 10.11.20221 №6 работы по посеву луговых газонов тракторной сеялкой на сумму 1 149,5 тыс. рублей (ФОК СОШ №43). МУ «Улан-Удэстройзаказчик» предоставлены материалы фотофиксации проводимых работ. При этом Контрольно-счетная палата отмечает, что на момент проведения проверки луговой газон фактически отсутствует. Таким образом, в нарушение ст.162 и ст.34 Бюджетного Кодекса РФ не обеспечена результативность использования бюджетных ассигнований, сумма неэффективных расходов составила – 4 868,3 тыс. рублей, из них на устройство хоккейной коробки – 3 467,4 тыс. рублей (СОШ №13), устройство системы видеонаблюдения 79,7 тыс. рублей (СОШ №13), устройство освещения - 171,7 тыс. рублей (СОШ №13), посев луговых газонов (1149,5 тыс. рублей). В период контрольного мероприятия МУ «Улан-Удэстройзаказчик» направлено письмо-претензия в адрес ООО «Балси» по устранению выявленных нарушений и замечаний в рамках гарантийных обязательств.



8.3.6. Контрольно-счетная палата отмечает, что при фактическом осмотре объектов строительства также обнаружены следующие недостатки, не обеспечивающие в том числе безопасность учащихся:

а) По ФОК СОШ №13:

- в отдельных местах беговой дорожки имеются выбоины;

б) По ФОК СОШ №43 на площадке хоккейной коробки в угловой части подпорной стены имеется вертикальная трещина;


в) По ФОК СОШ №55:

- частичное повреждение резинового покрытия хоккейной площадки (размером 5 на 10 см), резинового покрытия беговой дорожки (размером 15 на 3 см);

- части опор электроосвещения имеют острые выступы;

- имеются разрывы в местах стыков стоек турникового комплекса «Воркаут-ГТО» с резиновым покрытием;

- имеются пустоты в местах соединения блоков подпорной стены.

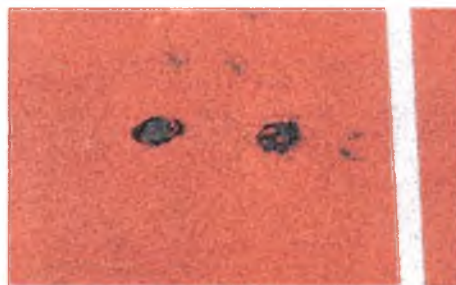

9. Выводы

9.1. В рамках контрольного мероприятия палатой проведена проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств в размере 102 863,7 тыс. рублей, выделенных в 2021 году на строительство физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа в СОШ №№ 13, 43, 55.

Строительство объектов осуществлялось в рамках реализации государственной программы РФ «Развитие физической культуры и спорта», государственной программы РБ «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики», муниципальной программы «Развитие образования г. Улан-Удэ». По результатам строительства физкультурно-оздоровительных комплексов в 2021 году СОШ №13, СОШ №43, СОШ №55 обеспечены плоскостными спортивными сооружениями открытого типа (футбольные поля, хоккейные коробки, спортивные площадки, беговые дорожки, трибуны и другое), что способствовало решению задач федерального проекта «Спорт - норма жизни» в рамках национального проекта «Демография» по созданию для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, и подготовки спортивного резерва.

9.2. «МУ «Улан-Удэстройзаказчик» по результатам осуществления бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности получены заключения о соответствии построенного объекта капитального строительства требованиям

проектной документации Республиканской службы государственного строительного и жилищного надзора:

- по объекту: «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа в МАОУ «СОШ №13 г.Улан-Удэ» №56-1-7/2021 от 30.12.2021 года (объект не передан в эксплуатирующую организацию в связи с проведением работ по устранению замечаний по качеству выполненных работ).

- по объекту: «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа в МАОУ «СОШ №43 г.Улан-Удэ» №59-1-2/2021 от 30.12.2021 года (объект не передан в эксплуатирующую организацию в связи с проведением работ по устранению замечаний по качеству выполненных работ).

- по объекту: «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа в МАОУ «СОШ №55 г.Улан-Удэ» №57-1-7/2021 от 30.12.2021 года (объект принят на учет муниципальной казны и закреплен на праве оперативного управления за СОШ №55 распоряжением КУИиЗ от 20.06.2022 №292).

9.3. Проверка расходования бюджетных средств показала, что средства израсходованы по целевому назначению и в целом эффективно. Однако МУ «Улан-Удэстройзаказчик» при осуществлении бюджетных инвестиций допущены следующие нарушения действующего законодательства:

9.3.1. В нарушение ст. 96 Федерального закона №44-ФЗ, ст. 711, 720 Гражданского кодекса РФ МУ «Улан-Удэстройзаказчик» приняты и оплачены фактически невыполненные работы на сумму 263,8 тыс. рублей, что привело к неправомерным расходам бюджетных средств.

9.3.2. В нарушение ст.162 и ст.34 Бюджетного Кодекса РФ не обеспечена результативность использования бюджетных ассигнований, сумма неэффективных расходов составила 4 868,3 тыс. рублей. В СОШ №13 система видеонаблюдения на стадионе находится в неисправном состоянии, из 21 уличных консольных светильников функционирует только 12. Хоккейная коробка СОШ №13 находится в непригодном для использования состоянии в связи с разломом резинового покрытия и бетонного основания хоккейной площадки. Кроме того, фактический осмотр объекта строительства показал, что в СОШ №43 на момент проведения проверки луговой газон фактически не прижился.

9.3.3. При анализе действий заказчика в процессе исполнения контрактов по строительству ФОК СОШ №13, СОШ №43, СОШ №55 установлены нарушения требований ст.110.2 Федерального закона №44-ФЗ, Методики составления сметы контракта, предметом которого являются строительство, реконструкция объектов капитального строительства (приказ Минстроя России от 23.12.2019 №841/пр) при заключении дополнительных соглашений на общую сумму 18 801,3 тыс. рублей, выразившееся в несоблюдении требований законодательства по составлению смет контракта с разбивкой по наименованиям комплексов (видов) работ и их цены на единицу измерения.

Кроме того, сведения об исполнении контрактов от 07.06.2021 (ФОК СОШ №13, ФОК СОШ №43) в нарушение ч.3 ст.103 Федерального закона №44-ФЗ размещены в реестре контрактов с нарушением регламентированного срока (не позднее 5 рабочих дней). Информация об исполнении контрактов размещена в ЕИС 14.01.2022 года, при этом дата платежных поручений – от 24.12.2021 (п/п №3313,

№3320). Нарушения содержат признаки административного правонарушения по ч. 2 ст. 7.31 КоАП РФ.

9.3.4. МУ «Улан-Удэстройзаказчик» в нарушение ч.6 ст.34 Федерального закона №44-ФЗ не направлены подрядным организациям требования по уплате неустоек за нарушение сроков выполнения контрактов, в т.ч. ООО «Энергостандарт» на сумму 105,0 тыс. рублей, ООО «Балси» на сумму 82,1 тыс. рублей.

9.3.5. При фактическом осмотре объектов строительства установлены другие недостатки: наличие в резиновом покрытии беговой дорожки выбоин, трещины на площадке хоккейной коробки, частичное повреждение резинового покрытия хоккейной площадки, части опор электроосвещения имеют острые выступы и другое.

10. Предложения:

10.1. Направить отчет о результатах проверки в Улан-Удэнский городской Совет депутатов, мэру города Улан-Удэ.

10.2. Направить представление МУ «Улан-Удэстройзаказчик» с предложениями:

- обеспечить проведение претензионной работы по восстановлению (выполнению работ) неправомерно использованных бюджетных средств в сумме 263,8 тыс. рублей, неэффективных расходов в сумме 4 868,3 тыс. рублей, устранению выявленных замечаний по качеству проведенных работ, не обеспечивающих в том числе безопасность учащихся;

- направить подрядным организациям требования по уплате неустойки за нарушение сроков выполнения контракта, в т.ч. ООО «Энергостандарт» на сумму 105,0 тыс. рублей, ООО «Балси» на сумму 82,1 тыс. рублей;


- при осуществлении бюджетных инвестиций обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

- рассмотреть вопрос об ответственности должностных лиц, допустивших нарушения действующего законодательства.

10.3. Направить информацию о нарушениях требований Федерального закона №44-ФЗ в Министерство финансов Республики Бурятия для принятия правового решения.

Аудитор

Инспектор



Е.Г. Данцев

Т.И. Синицына

Перечень изученных документов

1) Федеральные законы:

- Гражданский кодекс РФ;
- Бюджетный кодекс РФ;
- Градостроительный кодекс РФ;
- от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»;
- от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;
- от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете»;
- от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
- от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

2) Указ Президента РФ от 07.05.2018 №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;

3) Постановления Правительства РФ:

- от 21.01.2015 №30 «О федеральной целевой программе «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 - 2020 годы»;
- от 30.09.2021 № 1661 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта» и о признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации»;
- от 15.05.2017 №570 «Об установлении видов и объемов работ по строительству, реконструкции объектов капитального строительства на территории Российской Федерации, которые подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по государственному и (или) муниципальному контрактам, и о внесении изменений в Правила определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом»;

4) Постановление Госкомстата РФ от 21.01.2003 №7 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету основных средств»;

5) Приказы Минстроя России:

- от 27.07.2017 №1033/пр «СП 68.13330.2017. Свод правил. Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 3.01.04-87»;

- от 19.06.2020 № 332/пр «Об утверждении Методики определения затрат на строительство временных зданий и сооружений, включаемых в сводный сметный расчет стоимости строительства объектов капитального строительства»;

- от 04.08.2020 № 421/пр «Об утверждении Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации»;

6) Приказы Минфина России:

- от 01.12.2010 №157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению»;

- от 14.02.2018 № 26н «Об Общих требованиях к порядку составления, утверждения и ведения бюджетных смет казенных учреждений» (далее – приказ Минфина России от 14.02.2018 №26н);

7) Постановление Правительства РБ от 29.12.2012 № 823 «Об утверждении Государственной программы Республики Бурятия «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики»;

8) Решения Улан-Удэнского городского Совета депутатов:

- от 09.12.2020 №142-16 «О бюджете городского округа «город Улан-Удэ» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (по тексту отчета – решение о бюджете г.Улан-Удэ на 2021 год);

- от 21.04.2010 №272-21 «Об утверждении положения о порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом городского округа «город Улан-Удэ» (далее – решение от 21.04.2010 №272-21);

11) Постановления Администрации г. Улан-Удэ:

- от 19.03.2014 №62 «Об утверждении Правил осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности за счет средств бюджета городского округа «город Улан-Удэ»;

- от 28.11.2019 №366 «Об утверждении Муниципальной программы «Развитие образования г. Улан-Удэ»;

12) Распоряжения Администрации г. Улан-Удэ:

- от 21.12.2020 № 1244-р «Об утверждении Плана реализации мероприятий Муниципальной программы «Развитие образования города Улан-Удэ» на 2021 год и плановый период 2022 - 2023 годов»;

- от 19.05.2021 № 418-р «О принятии решения о предоставлении бюджетных инвестиций на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности»;

- от 25.06.2021 № 577-р «О принятии решения о предоставлении бюджетных инвестиций на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности».
